



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CATARINENSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MURO DE CONTEÇÃO CAMPUS FRAIBURGO

LDI: 23,73%


Área Construída: 213,50m²

Local: RUA CRUZ E SOUZA, 100, CENTRO, FRAIBURGO - SC

Resp. Técnico: Engenheiro Civil Rommel Souza da Silva

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO					TOTAL
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	120 - 150 DIAS	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	93% R\$ 16.679	7% R\$ 1.280	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	100,00% 18.376,44
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	27% R\$ 403	73% R\$ 1.072	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	100,00% 1.475,32
03	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 0	50% R\$ 4.009	50% R\$ 4.009	R\$ 0	R\$ 0	100,00% 8.018,27
04	SUPERESTRUTURA	R\$ 0	R\$ 0	50% R\$ 44.387	50% R\$ 44.387	R\$ 0	100,00% 88.773,54
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	50% R\$ 6.808	50% R\$ 6.808	100,00% 13.615,32
06	DRENAGEM	R\$ 0	R\$ 0	6% R\$ 429	45% R\$ 3.126	49% R\$ 3.381	100,00% 6.937,22
07	PINTURA	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	100% R\$ 3.616	0,00% 3.616,49
08	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	100% R\$ 711	100,00% 711,20
TOTAL		12,46% 17.081,87	4,52% 6.361,65	34,45% 48.825,38	38,33% 54.320,88	10,24% 14.516,39	R\$ 141.523,80

0 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
0,00%	12,46%	4,52%	34,45%	38,33%	10,24%
0,00%	12,46%	16,98%	51,43%	89,76%	100,00%

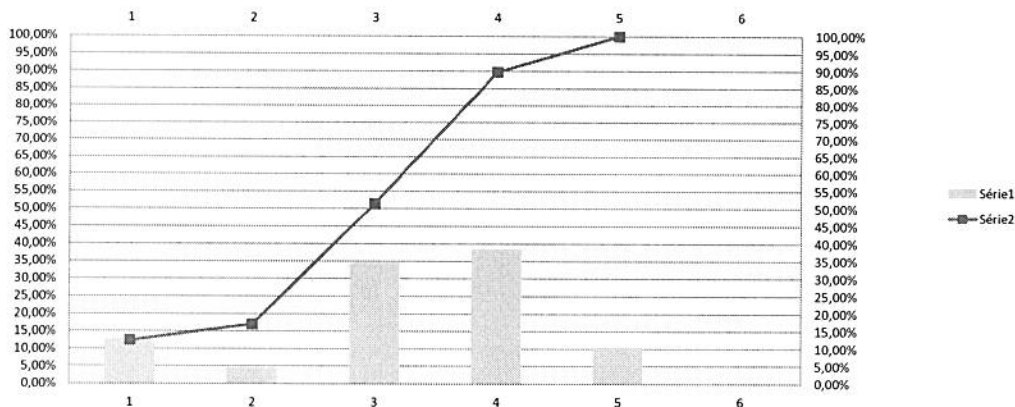

Rommel Souza da Silva
Engº Civil
CREA: 2106506015
